

INFORME N° 008-2025

A : Lic. Elias Abel Hidalgo arroyo
Director General del IESTP "Marco"
Del : Julio César Canchaya Huaylinos
Asunto : Entrega de Instalación de una Puerta Metálica 1.96 cm. x 0.82 m.
Fecha : Marco, 28 de octubre de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho y a la vez aprovecho oportunidad para saludarlo, además informarle sobre la instalación de una Puerta Metálica en el establo de vacunos del I.E.S.T.P. "Marco".

Se encontró:

- Deteriorado la puerta
- El armazón se encontraba desoldado.

Se realizó el trabajo:

- Se retiró la puerta.
 - Instalación de la Puerta metálica de 1.96 cm. de alto x 0.82 metro de ancho confeccionado con tubo de 40 x 60, para el marco, tubo cuadrado de 1 1/4 x 1 1/4 x 1.5 de espesor, chapa de 03 golpes pintura base y esmalte sintética, colocación de 02 rejas metálicas en las ventanas del aula de enfermería técnica y además se realizaron trabajos de reforzamiento de chapas principal del establo de vacunos, establo ovino y puerta principal
- Se deja culminado el trabajo según el contrato y su TDR. Con garantía de 01 año.

Es todo cuanto tengo que informarle a usted.


Atentamente;



Julio César Canchaya Huaylinos

DNI N° 47123762

ANTES

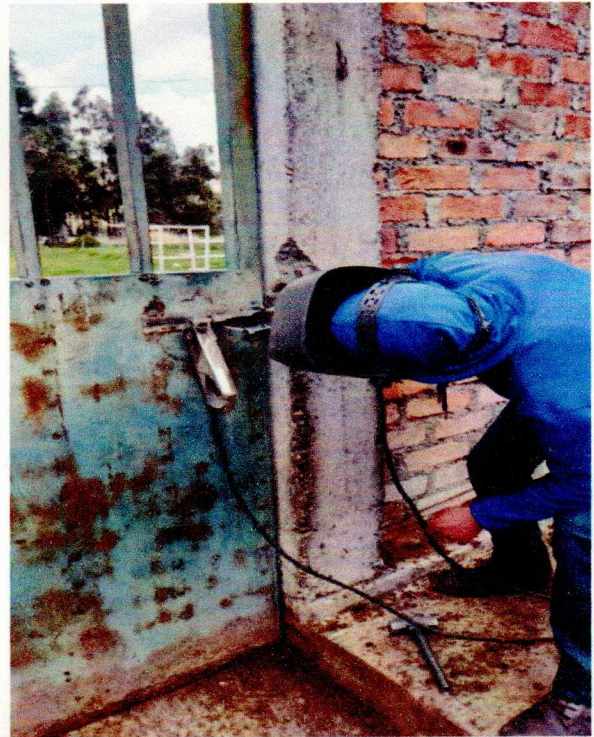

DESPUES

